



**EMPRESA MUNICIPAL PARA O
DESENVOLVIMENTO DE FRANCA**

REALIZAÇÕES – ANO 2013

INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta um resumo das obras executadas pela EMDEF – Empresa Municipal para o Desenvolvimento de Franca, entre os meses de janeiro a dezembro de 2013.

1. Contratos de Prestação de Serviço.

1.1 Remendo Asfáltico

Serviços de Remendo asfáltico nas ruas e Avenidas de Franca utilizando Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)

Janeiro a abril 2013: Processo nº 27864/12, contrato: nº 184/12

Valor total do contrato: R\$ 749.808,00



Valor medido entre janeiro e Abril de 2013: R\$ 422.529,00

Maió a dezembro de 2013: Processo nº 12.484/13, contrato nº 043/2013

Valor total do Contrato: R\$ 4.109.100,00

Valor total medido entre maio e novembro de 2013: R\$ 2.296.986,90

Pedidos atendidos através do Programa Disque-Tapa Buracos: 2.015

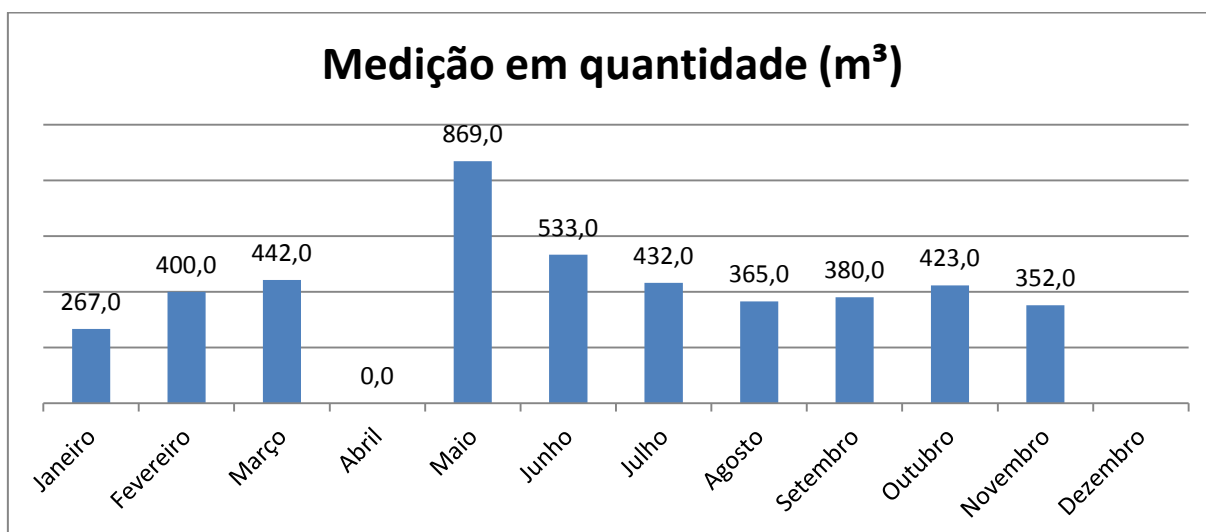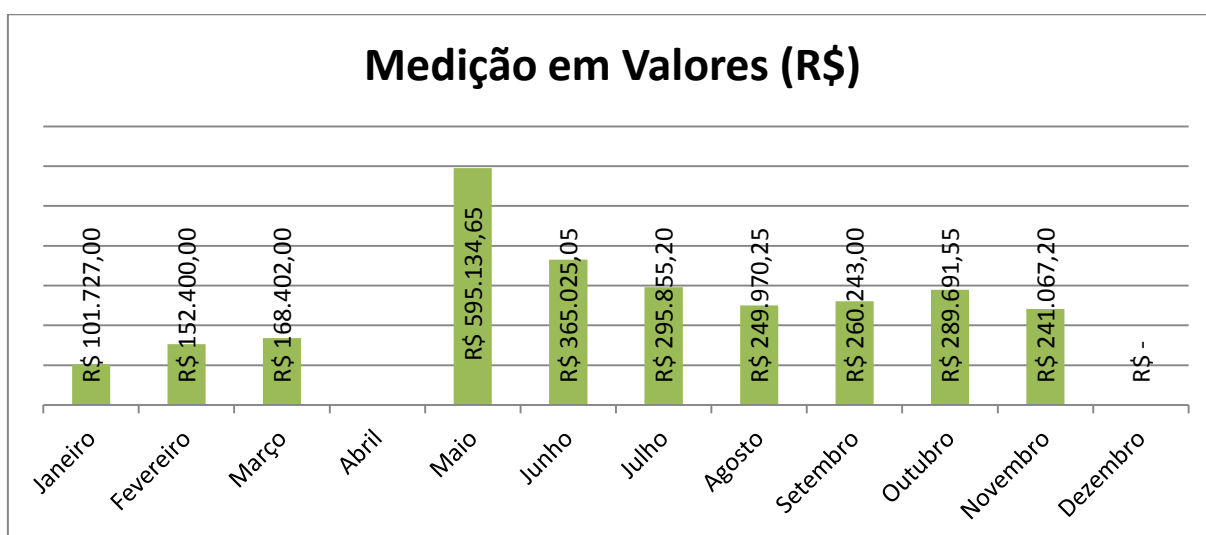

1.2 Sinalização de Trânsito


Serviços correlatos a sinalização de trânsito, sendo:

- Sinalização horizontal, transversal, longitudinal, símbolos e legendas e remoção de sinalização existente com tinta acrílica viária própria;
- Sinalização vertical com placas de regulamentação, advertência e informativa, com instalação de postes, colunas e braços projetados;
- Dispositivos auxiliares: Tachas e tachões, prismas de concreto.

Janeiro a Dezembro: Processo nº 996/11, contrato nº 122/201, período de Julho de 2011 a julho de 2014 (Prazo Aditado)

Valor Total do Contrato: R\$ 2.948.480,00

Valor Total Medido até novembro de 2013: R\$ 1.168.925,23

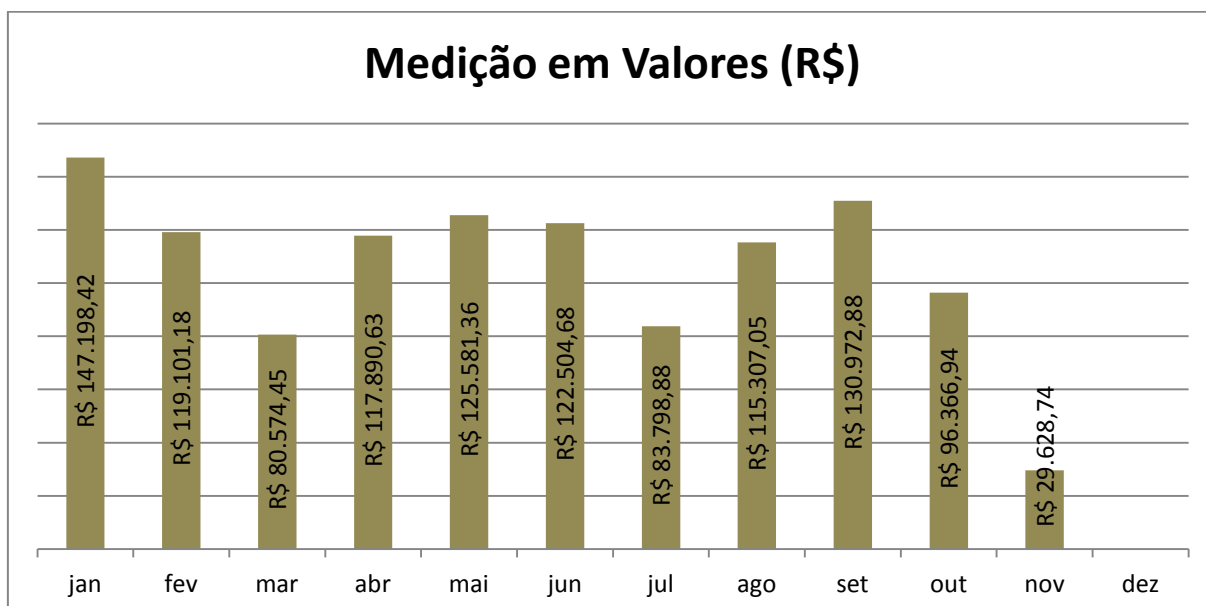

Principais Serviços e quantitativos executados: 3282 placas instaladas; 1934 postes e colunas instaladas; 154.182,00 m² de pintura de sinalização horizontal (pintura no pavimento).

1.3 Manutenção de Estradas Rurais

Serviços de roçada manual e mecânica, reconformação de plataforma, limpeza de bueiro e represa seca, abertura e esgotos, revestimento primário e outros serviços correlatos a manutenção de estradas não pavimentadas.

Julho a Dezembro de 2013: Processo nº 19.587/13, contrato nº 110/2013

Valor total do Contrato: R\$ 567.142,25

Total medido até novembro de 2013: R\$ 51.702,95

Principais Serviços e quantitativos: 20,52 Km de estradas regularizadas; 29.658 m² de estradas roçadas; 420 m² de estrada reforçada com pedra britada.

1.4 Recuperação de Guias e Sarjetas

Recuperação de guias e sarjetas nas ruas e avenidas de Franca, executado em concreto fck 13,50 Mpa com acabamento em argamassa.

Junho a Dezembro de 2013: Processo nº 15.590/13, contrato nº 107/2013

Valor Total do Contrato: R\$ 330.000,00

Total medido até novembro de 2013: 752,50 metros de guias com valor total de R\$ 24.832,50

2. Contrato de Obras: Pavimentação

2.1 Alargamento da Rua Washington Luiz no Cruzamento com Av. Dr. Hélio Palermo

Execução de pavimentação no alargamento da Rua Washington Luiz com Av., Dr. Hélio Palermo com o objetivo de adequação da via à instalação de nova ponte neste cruzamento.

Período de Execução: 15/03/2013 a 19/04/2013

Processo: 5678/2013

Contrato: 032/2013

Valor total da Obra: R\$ 36.288,44

Principais serviços e quantitativos: 369,87 m² de Pavimentação asfáltica, 251,80 m³ de passeio em concreto, 117,14 m de guias e sarjetas de concreto.

2.2 Rua Ângelo Naldi – Entre Rua Wilson Teixeira e Rua Augusto Vanini – Belvedere Bandeirante

Período de Execução: 04/6/2013 a 20/06/2013

Processo: 51.980/2012

Contrato: 096/13

Valor total da Obra: R\$ 136.393,56

Principais serviços e quantitativos: 1316,73 m² de pavimentação asfáltica; 382,50 metros de guias e sarjetas de concreto; 184,25 m de tubos de concreto.

2.3 Abertura e Pavimentação da 2ª pista da Av. Jaime Teline – Entre Av. São Vicente E Chico Neca.

Período de execução: 15/08/2013 a 20/09/2013

Valor total da Obra: 394,815,21

Principais serviços e Quantitativos: 6700 m² de pavimentação asfáltica; 1359,29 m de guias e sarjetas de concreto; 4629 m² de plantio de grama batatais.

3. Contrato de Obras : Alteração de Trânsito

3.1 Cruzamento da Av. Integração com Rua Francisco Marques

Período de Execução: 05/07/2013 a 09/07/2013

Processo: 19979/2013

Contrato: 111/2013

Valor total da Obra: R\$ 45910,15

Principais serviços e quantitativos: 498,04 m² de Pavimentação asfáltica, 63,48 m de guias e sarjetas de concreto.

3.2 Cruzamento das Avenidas Dr. Flávio Rocha e Dr. Moacir Vieira Coelho

Período de execução: 12/07/2013 à 17/07/2013

Processo: 12002/2013

Contrato: 050/2013

Valor Total da Obra: R\$ 42.382,03

Principais serviços e quantitativos: 70,88 m² de passeio em concreto; 144,31 m de guias e sarjetas de concreto; 411,00 m² de Pavimentação asfáltica.

3.3 Rotatórias da Av. Adhemar de Barros

Período de Execução: 25/10/2013 a 25/11/2013 (obras em andamento)

Processo: 42.206/2013

Contrato: 179/2013

Valor total da Obra: R\$ 254.830,57

Valor medido até novembro de 2013: R\$ 81.244,49

Principais serviços e quantitativos: 3126,83 m² de pavimentação asfáltica; 2230,11 m² de plantio de Grama Batatais; 1318,34 m de guias e sarjetas.

4. Contrato de Obras: Drenagem

4.1 Drenagem da Rua Jamil Abdala – Jd. Guanabara

Período de Execução: 24/07/2013 a 09/08/2013

Processo: 52.376/12

Contrato: 61/2013

Valor total da Obra: R\$ 65634,51

Principais Serviços e Quantitativos: 187 metros de tubos de concreto; 9 bocas de lobo; 3 poços de visita.

4.2 Drenagem da Rua Delcides Presoto

Período de Execução: 21/09/2013 a 06/12/2013

Processo: 12034/13

Contrato: 130/13

Valor total da Obra: R\$ 361.058,69

Principais serviços e quantitativos: 504,30 m de tubos de concreto instalados; 14 bocas de lobo do tipo 1, 2 e 3; 9 poços de visita; 38,93 m³ de remendo asfáltico.

4.3 Drenagem da Rua Madre Rita com Rua Peru

Período de execução: 01/06/2013 a 21/06/2013

Processo: 58217/12

Contrato: 064/13

Valor total da Obra: R\$ 20.067,15

Principais serviços e quantitativos: 62 m de tubos de concreto 600 mm; 2 poços de visita; 3,1 m³ de remendo asfáltico.

4.4 Drenagem Rua Guilherme Luiz Pucci – Vila Monteiro

Período de Execução: 25/03/2013 a 25/04/2013

Processo: 56.769/12

Contrato: 30/2013

Valor total do contrato: R\$ 96.301,00

Principais serviços e quantitativos: 347 m de tubos de concreto; 9 poços de visita; 17,35m³ de remendo asfáltico.

4.5 Drenagem da Rua Cruz e Souza – Vila Isabel

Período de execução: 1/02/2013 a 25/03/2013

Processo: 48663/12

Contrato: 02/2013

Valor total da Obra: 143.869,42

Principais Serviços e quantitativos: 398,60 m de tubos de concreto; 7 poços de visita; 12 bocas de lobo; 100 m de guias e sarjetas de concreto; 24,32 m³ de remendo asfáltico.

5. Obras diversas

5.1 Revitalização do Córrego do Engenho Queimado

Período de execução: 01/08/2013 a 25/11/2013 (Obras em andamento)

Processo: 31.488/13

Contrato: 136/2013

Valor total da Obra: R\$ 11.199.193,30

Principais serviços e quantitativos: 98.772,70 m³ de escavação em campo aberto; 87.749 m³ de carga e transporte de material; 2.241 m de canalização de córrego em gabião caixa e gabião colchão; plantio de 13560 mudas de árvores ornamentais; 3710 m² de pavimento intertravado; 9400 m² de passeio de concreto; 128.000 m² de limpeza de terreno.

Hugo César Chereguini Filho
Diretor Técnico

Silvio de Oliveira
Diretor Presidente
