

EMPRESA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE FRANCA

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES

Realizações em 2020

Relatório de apresentação das principais atividades executadas pela EMDEF no ano de 2020, incluindo obras e serviços contratados pela Prefeitura Municipal de Franca e particulares.

SUMÁRIO

1	Resumo geral de atividades.....	04
2	Contratos de serviços.....	06
2.1	Contrato de Serviços para Prefeitura de Franca.....	06
2.1.1	Manutenção de Vias Pavimentadas – Remendo Asfáltico.....	06
2.1.2	Sinalização de Trânsito.....	10
3	Contratos de obras.....	12
3.1	Contrato de obras para Prefeitura de Franca.....	12
3.1.1	Ampliação da Estação Elevatória de Esgoto do Residencial Copacabana.....	12
3.1.2	Recapeamento Asfáltico – Ruas e Avenidas de Franca/SP.....	13
3.1.3	Obra de alteração do cruzamento da Av.Presidente Vargas com a Av. Dom Pedro I.....	14
3.1.4	Abertura da 9ª Célula do Aterro Sanitário.....	14
3.1.5	Execução de Lombada.....	15
3.1.6	Serviço de Execução de Passeio de Concreto.....	15
3.1.7	Execução de Lombofaixa.....	15
3.2	Contratos de obras para terceiros.....	15
3.2.1	Pavimentação e Drenagem – Chemin.....	15
3.2.2	Reconstrução do Acesso ao Condomínio Olivito.....	16
3.2.3	Furnas - Porto Ferreira - Remendo de Vala.....	17
3.2.4	Manutenção de Estrada Rural Particular.....	18
3.2.5	Sinalização de trânsito – Instalação de Gradil - Av. Armando Sales Oliveira - R.Pagano.....	18

3.2.6	Sinalização de trânsito – Av. Armando Sales Oliveira - R.Pagano.....	19
3.2.7	Vila Hípica-Remendo Asfáltico.....	19
3.2.8	Residencial Ferrete – MRV.....	19
3.2.9	Residencial Ferrete – MRV – complementar.....	19
3.2.10	Condomínio Villaggio Di Firenze.....	20
3.2.11	Fazenda de Leite São Tomé.....	20
3.2.12	Posto Paineirão.....	20
3.2.13	Av. Champagnat x Av. Alonso Y Alonso.....	20
4	Operação do Aterro Sanitário.....	21
5	Operação da Pedreira.....	23
6	Transporte Coletivo.....	25

1 – Resumo Geral de Atividades

Descrição do serviço	Total	Unidade
Área Pavimentada	1.000,00	m2
Guias Executadas	697,70	m
Pintura de Solo (m2)	109.441,90	m2
Remendo Asfáltico com CBUQ (m3)	4.402,39	m3
Instalação de placas de trânsito (und)	875,00	und
Lombadas	292,08	m
Recapeamento Asfáltico	105.380,14	m2

Tipo	Local	Valor	Valor Medido no ano
Obra	Chemin - Regularização de Rua entre Av. Rio Negro e Rio Amazonas (Unimed)	R\$ 212.229,86	R\$ 212.229,86
Serviço	Remendo asfáltico nas ruas e avenidas do município de Franca : Franca-SP	R\$ 1.789.590,00	R\$ 1.789.590,00
Serviço	Remendo asfáltico nas ruas e avenidas do município de Franca : Franca-SP	R\$ 2.249.706,40	R\$ 2.249.706,40
Serviço	Remendo asfáltico nas ruas e avenidas do município de Franca : Franca-SP	R\$ 624.733,86	R\$ 496.358,55
Obra	Res. Olivito - Rotatória de Acesso	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00
Obra	Furnas - Porto Ferreira - Remendo de Vala	R\$ 47.500,00	R\$ 47.500,00
Obra	Manutenção de Estrada Rural Particular	R\$ 4.539,99	R\$ 4.539,99
Obra	Execução de Lombofaixa	R\$ 720.000,00	R\$ 35.937,30
Obra	Recapeamento Asfáltico - Franca 2020	R\$ 3.998.863,71	R\$ 2.927.119,25
Obra	Av. Armando Sales Oliveira - R.Pagano	R\$ 3.283,00	R\$ 3.283,00

Obra	Av. Armando Sales Oliveira - R.Pagano	R\$ 55.627,91	R\$ 55.627,91
Obra	Abertura da 9ª Célula do Aterro Sanitário	R\$ 2.368.509,96	R\$ 1.794.063,15
Obra	Vila Hípica-Remendo Asfáltico	R\$ 13.175,00	R\$ 13.175,00
Obra	Obra de alteração do cruzamento da Av.Presidente Vargas com a Av. Dom Pedro	R\$ 134.621,70	R\$ 127.196,76
Obra	Estação Elevatória Copacabana	R\$242.367,87	R\$76.400,38
Obra	Residencial Ferrete - MRV	R\$ 98.230,00	R\$ 98.230,00
Obra	Residencial Ferrete - MRV	R\$ 3.577,00	R\$ 3.577,00
Obra	Passeio de Áreas Publicas	R\$197.822,60	R\$ 17.262,92
Obra	Execução de Lombada - Tipo A	R\$ 119.998,80	R\$ 104.259,93
Obra	Execução de Lombada - Tipo B	R\$ 40.002,05	R\$ 1.003,59
Obra	Av. Champagnat x Av. Alonso y Alonso.	R\$ 433.000,00	R\$ 329.936,58
Obra	Remendo Asfáltico de Vala - Condomínio Villaggio Di Firenze	R\$ 2.025,00	R\$ 2.025,00
Obra	Pavimentação do Acesso da Fazenda de Leite São Tomé - Área Particular	R\$ 51.140,00	R\$ 51.140,00
Obra	Posto Paineirão	R\$ 5.767,60	R\$ 5.767,60
Serviço	Sinalização de Trânsito	R\$ 3.864.205,00	R\$ 1.247.438,30
		R\$ 17.091.994,71	R\$ 11.685.405,55

2 – Contratos de Serviços

2.1 – Serviços para Prefeitura de Franca

2.1.1 – Manutenção de Vias Pavimentadas – Remendo Asfáltico

Execução de remendo asfáltico com massa usinada a Quente (CBUQ) e PMF (Pré-misturado a Frio) nas Ruas e Avenidas do Município de Franca

Processo nº: 65.906/2019

contrato nº: 0126/2019

Valor do contrato: R\$ 1.789.590,00

Valor medido: R\$ 1.789.590,00

Processo nº: 24.279/2020

contrato nº: 0066/2020

Valor do contrato: R\$ 1.799.765,12

Valor aditado: R\$ 449.941,28

Valor medido: R\$ 2.249.706,40

Processo nº: 41.813/2020

Contrato nº: 0170/2020

Valor do contrato: R\$ 624.743,69

Valor medido: R\$ 496.358,55

Valor total: R\$ 4.664.030,26

Valor medido no ano: R\$ 4.535.654,95

Produção de Remendo Asfáltico em m ³	
Janeiro	140,95
Fevereiro	299,22
Março	363,08
Abril	191,99
Maio	379,56
Junho	495,20
Julho	642,22
Agosto	528,41
Setembro	482,61
Outubro	326,74
Novembro	337,04
Dezembro	215,37
Total	4402,39

Tabela 1: Produção de Remendo asfáltico em m³ em 2020

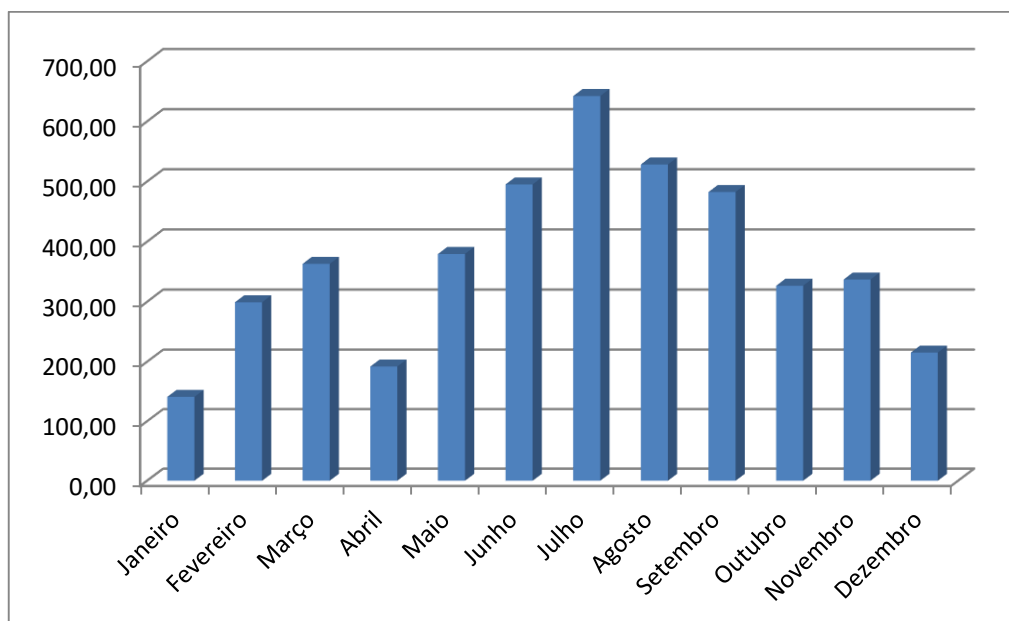


Gráfico 1: Gráfico de produção de Remendo Asfáltico





2.1.2 – Sinalização de Trânsito

Processo nº: 13.721/19

Contrato nº: 017/19

Valor do Contrato: R\$ 3.684.205,00

Valor Medido no ano: R\$ 1.247.438,30

Principais Quantitativos:

- Pintura de Solo: 107.664,55 m²
- Instalação de Placas: 2.107 unidades





3 - Contratos de Obras

3.1 - Contrato de Obras para Prefeitura de Franca

3.1.1 – Ampliação da Estação Elevatória de Esgoto do Residencial Copacabana – Rua Regina Marta Moraes com a Rua Pedro Silveira, no residencial Julio D’elia – Franca – SP

Processo nº: 60.995/2019

Contrato nº: 064/2020

Valor do Contrato: R\$ 242.367,87

Valor Medido: R\$ 76.400,38

Período de Obra: 01/12/2020 a 12/02/2021



3.1.2 – Recapeamento Asfáltico – Ruas e Avenidas de Franca/SP

Processo nº: 13.647/19

Contrato nº: 016/2019

Valor do Contrato: R\$ 3.998.863,71

Valor Medido no ano: R\$ 2.927.119,25

Período: 11/05/2020 a 29/10/2020

Área total recapeada no ano: 76.080,94 m²

Ruas contempladas:

- Rua Joaquim Martins, Parque do Horto
- Rua Francisco Assis de Souza, Parque do Horto
- Rua Luiz Rodrigues Pereira, Jardim Noêmia
- Rua Pedro Monteiro Paes Leme, Jardim Noêmia
- Av. Magistrado Renato Salles Abreu, Jardim Aeroporto I
- Rua General Bertholdo Klinger, Jardim Redentor
- Rua Abrão Jorge, Jardim Integração
- Rua Doutor Bráulio Andrade Junqueira, Jardim Integração
- Rua Lina Pichione Rocha, Vila Formosa
- Rua Laureano Antônio do Vale, Vila Formosa
- Rua Ruth Jacintho Conrado - Vila formosa
- Rua Izabel Iliza de Lima, São Joaquim
- Rua Conceição Cáceres Munhoz, Vila Santa Rita
- Rua São Tomás de Aquino, Jd. Francano
- Cemitério da Saudade





3.1.3 – Obra de alteração do cruzamento da Av. Presidente Vargas com a Av. Dom Pedro - Dispositivo Viário - Av. Presidente Vargas x Av. Dom Pedro I

Processo nº: 23.608/19

Contrato nº: 033/2020

Valor do Contrato: R\$ 134.621,70

Valor Medido: R\$ 127.196,76

Período: 09/06/2020 a 02/09/2020

3.1.4 – Abertura da 9ª Célula do Aterro Sanitário

Contrato nº: 077/2019

Valor do Contrato: R\$ 2.368.509,96

Valor Medido no ano: R\$ 1.794.063,15

Período: 20/05/2020 a 08/10/2020

3.1.5 Execução de Lombada - Tipo A - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 600

Contrato nº: 0156/2020

Valor do Contrato: R\$119.998,80

Valor Medido no ano: R\$105.263,52

3.1.5 Execução de Lombada - Tipo B - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 600

Contrato nº: 0156/2020

Valor do Contrato: R\$40.002,05

Valor Medido no ano: R\$1.003,59

3.1.6 Serviço de Execução de Passeio de Concreto

Contrato nº: 0097/2019

Valor do Contrato: R\$197.822,60

Valor Medido no ano: R\$1.613,14

Período: 11/09/2020 a 14/09/2020

3.1.7 Execução de Lombofaixa

Contrato nº: 0097/2019

Valor do Contrato: R\$720.000,00

Valor Medido no ano: R\$35.937,30

Período: 08/05/2020 a 14/09/2020

3.2 – Contrato de Obras para Terceiros

3.2.1 – Chemin - Regularização de Rua entre Av. Rio Negro e Rio Amazonas (Unimed) - Pavimentação e Drenagem

Contrato nº: 061/19

Valor do Contrato: R\$ 212.229,86

Valor Medido: R\$ 212.229,86

Período: 20/05/2020 a 08/06/2020



3.2.2 – Residencial Olivito - Rotatória de Acesso - Reconstrução do Acesso ao Condomínio Olivito

Contrato nº: 061/18

Valor do Contrato: R\$ 9.000,00

Valor medido: R\$ 9.000,00

Período: 27/02/2020 a 03/03/2020





3.2.3 – Furnas - Porto Ferreira - Remendo de Vala

Contrato nº: 148.3/19

Valor do Contrato: R\$47.500,00

Valor medido: R\$ 47.259,89

Período de execução: 09/03/2020 a 24/03/2020





3.2.4 – Manutenção de Estrada Rural - Amauri Junqueira

Contrato nº: 023.1/20

Valor do Contrato: R\$ 4.539,99

Valor medido: R\$ 4.539,99

Data de Execução: 16/04/2020

3.2.5 – SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E DEMAIS OBRAS VIÁRIAS CONFORME ORÇAMENTO - Av. Armando Sales Oliveira - R.Pagano - Instalação de Gradil

Contrato nº: 139.7.19

Valor do Contrato: R\$3.283,00

Valor medido: R\$3.283,00

Período de Execução: 21/09/2020 a 29/09/2020

3.2.6 – SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E DEMAIS OBRAS VIÁRIAS CONFORME ORÇAMENTO - Av. Armando Sales Oliveira - R.Pagano

Contrato nº: 139.4.19

Valor do Contrato: R\$ 55.627,91

Valor medido: R\$ 55.627,91

Período de Execução: 13/05/2020 a 02/06/2020

3.2.7 – Vila Hípica-Remendo Asfáltico - Remendo Asfáltico com CBUQ

Contrato nº: 029.1.20

Valor do Contrato: R\$ 13.175,00

Valor Medido: R\$ 13.175,00

Período de Execução: 28/05/2020 a 04/06/2020

3.2.8 – Residencial Ferrete - MRV - Pavimentação asfáltica do condomínio fechado Ferrete

Nº do Contrato: 039.1.20

Valor do Contrato: R\$ 98.230,00

Valor medição: R\$ 98.230,00

Período de execução: 01/08/2020 a 10/09/2020

3.2.9 – Residencial Ferrete - MRV - Pavimentação asfáltica do condomínio fechado Ferrete (Complementar)

Nº do Contrato: 039.1.20

Valor do Contrato: R\$ 3.577,00

Valor medição: R\$ 3.577,00

Período de execução: 01/08/2020 a 10/09/2020

3.2.10 - Condomínio Villaggio Di Firenze - Remendo Asfáltico de Vala

Contrato nº: 049.20

Valor da Obra: R\$ 2.025,00

Valor medido: R\$ 2.025,00

Data de execução: 14/10/2020

3.2.11 – Pavimentação do Acesso da Fazenda de Leite São Tomé - Pavimentação Asfáltica com CBUQ

Contrato nº: 068.4.20

Valor da Obra: R\$51.140,00

Valor medido: R\$51.140,00

Período de Execução: 20/11/2020 a 24/11/2020

3.2.12 – Posto Paineirão - Remendo Asfáltico com CBUQ

Nº do Contrato: 003.2.20

Valor da Obra: R\$ 5.767,60

Valor medido: R\$ 5.767,60

Período de execução: 17/02/2020

3.2.13 – Av. Champagnat x Av. Alonso Y Alonso - Dispositivo Viário no cruzamento da Av. Champagnat com Av. Dr. Ismael Alonso Y Alonso

Nº do Contrato: 047.21

Valor da Obra: R\$ 433.000,00

Valor medido: R\$ 5.767,60

Período de execução: 17/02/2020



5 – Operação da Pedreira

Produção Pedreira - Ano 2020

MÊS	PRODUÇÃO (m³)	
	PEDRA BRUTA	PEDRA BRITADA
Janeiro	0	0
Fevereiro	1560	1153
Março	1560	1153
Abril	1725	1629
Maiο	1390	1176
Junho	1333	1625
Julho	350	389
Agosto	890	910
Setembro	1840	1920
Outubro	1927	1945
Novembro	1630	1621
Dezembro	860	797
TOTAL	15065	14318

Tabela 5 – Produção 2020



Britador
